编者按

融合发展，谱写高质量发展新篇章

面对房地产市场需求波动大、行业转型升级快、优质资源获取难等各种不可控因素，如何通过内外部资源的高效融合和经营业务的迭代升级，实现资源效益与综合产出的最大化，是房地产行业面临的关键课题。融合发展是在我国经济转型升级背景下孕育的一种新的发展思路。

房地产行业是国民经济的压舱石，而传统的打法越来越跟不上时代发展的步伐，融合发展已是大势所趋。因此，本期专题分别就城市历史文化街区的多空间融合改造策略以及房企如何实现客户需求、企业赢利、建设品质等方面的产品力融合展开论述，旨在为房地产企业有选择性地开展空间或业态融合、强化核心竞争力、实现高质量发展提供助力。

《房地产世界》编辑部

栏目策划 / 李思思

执行 / 胡昭滔

城市历史文化街区改造项目的多空间融合策略

——以哈尔滨中华巴洛克历史文化街区三期改造项目为例

高犁难

摘要：城市历史街区改造工作的开展，能够满足商业价值增加与文化保护双重需求。然而，部分历史街区在改造过程中，街区原有肌理、文化内涵及建筑空间均遭到不同程度的破坏，导致文化传承缺失、街区活力不足、外来游客不认同等问题。本文以中华巴洛克历史文化街区三期改造项目为例，分析了项目改造的基本原则与难点；围绕三期改造项目的更高目标要求，提出了在历史文化街区改造中进行建筑空间网络与文化空间网络融合的理念，并以此引领改造的全过程；同时提出设计建造一体化、低碳、信息化以及风险管理等多项实施策略，以期为同类项目提供参考。

关键词：历史文化街区；建筑空间；文化空间；融合；设计建造一体化；信息化

历史文化街区作为一座城市的历史文化遗产核心组成部分，具有较高的历史文化价值和艺术价值。作为城市优秀历史文化的象征，历史文化街区成功改造后，不仅能更好地满足人们精神文化的需求，而且能成为带动一方经济发展的新动力。[1] 以 2023 年一季度为例，最终消费支出增长对我国经济增长的贡献率已经达到 66.6%。然而，部分历史文化街区花费巨额资金改造后，迎来的却是原居民的大量流失、外来游客的不认同，甚至是“城市记忆”难以延续的尴尬境地。因此，如何在更新改造旧街区的同时使老城市焕发新活力、撬动经济的增长，成为本文研究的重点。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 项目背景

中华巴洛克历史文化街区位于哈尔滨市道外区，是哈尔滨市近代发展中历史最为悠久的街区，也是哈尔滨市民族工商业的发源地。街区内拥有特色院落、胡同等物质文化资源，以及富有传统气息的商业文化、餐饮文化和民俗文化等非物质文化资源。目前，第一、二期项目已改造完成，相关部门正在积极推进三期改造项目。三期项目范围是南起南勋街、丰润街，北至同发街、升平街、地灵街，西起景阳街，东至十道街，如图 1 所示。

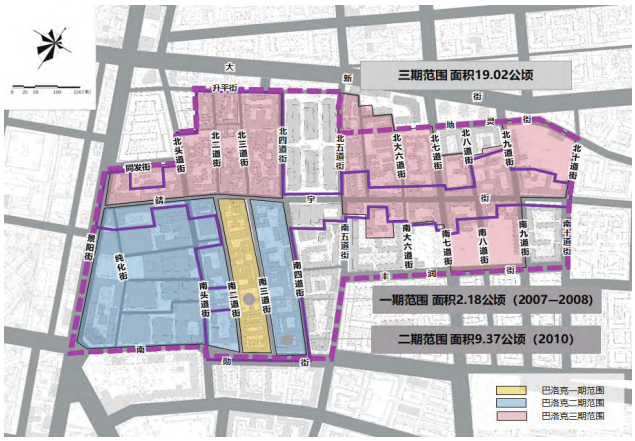


图 1　中华巴洛克历史文化街区三期项目范围

2 中华巴洛克历史文化街区三期项目改造的基本原则

2.1 以历史文化为引领

三期改造项目位于老道外，承载着底蕴深厚的城源文化、城源记忆及城源历史。这里曾是老道外最热闹的街区，众多历史悠久的冰城老字号聚集于此，已经成为街区中独有的文化风景，传承着哈尔滨的民俗文化，镌刻着哈尔滨的历史。三期改造中要重点关注那些能留住老味道、老风俗，具有文化传承功能的物质形态。[2] 如果在三期项目改造中加入过多的现代商业功能、新生文化业态，就会导致中华巴洛克历史文化街区的活态历史和活态文化逐渐消失。

2.2 修旧如旧

三期改造范围内的中华巴洛克建筑以矮楼、浮雕圆柱、雕花门窗、镂空铁门及中国传统的四合院为典型模式，这些中西合璧的复古建筑是哈尔滨市开埠的活化石。相关单位在进行三期项目改造时，应尽可能地保留历史原貌，修旧如旧，使哈尔滨的城市文脉得以延续；在进行三期改造项目的整体空间规划设计前，应充分查阅资料，进行实地调研，全面了解当时的历史背景、生活方式、经营模式与社会风俗；在对破损的建筑物确定修复方案时，应最大限度地体现其代表的建筑艺术与历史文化记忆。

2.3 整体性保护

（1）对历史建筑整体风貌进行保护。中华巴洛克风格的建筑装饰复杂，如蝙蝠、金蟾、石榴、牡丹等有吉祥意义的中式图案被广泛应用，导致改造修复成本和时间均高于普通的老旧建筑。在资金有限的情况下，改造修复工作往往被压缩。一些改造行为不仅破坏了建筑的原有面貌，而且直接导致历史街区内老建筑与其传统文化之间的原生联系被割裂。

（2）将历史建筑中的文化遗产包含在改造规划中。即相关单位在进行中华巴洛克历史文化街区三期项目改造过程中，应重视对整体环境的保护；除了规划区内可观的历史建筑遗产，还应考虑已经形成的、对当前及未来的社会生活产生重要影响的传统文化、社会风俗、经济业态等与历史街区的发展有着密切关系的非物质形态的恢复与延续。

2.4 重视公众参与

中华巴洛克历史文化街区要恢复活力，实现可持续发展，人是其中不可或缺的重要元素。按照“推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众”的文化遗产保护传承要求，在三期项目改造过程中，相关部门应推动公众参与到项目改造的全过程中，积极引导公众对规划设计提出合理建议、对建造活动进行全面监督、为街区运营积极献策。

2.5 依法依规

三期改造项目的实施，不仅要严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》等通用的建设工程法律法规，还应遵守国家行政管理部门发布的专业性规定。中华巴洛克历史文化街区三期改造项目必须做到依法合规，以确保改造后的街区实现传承历史文化、延续历史文脉，以及推动哈尔滨城市建设高质量发展、增强中华民族文化自信的目的。

中华巴洛克历史文化街区三期项目改造的难点：

（1）建成年代久远，建筑破败严重。中华巴洛克历史文化街区的文物、历史建筑大部分建于 1930 年前，虽然院落基本格局保存完好，但文物建筑、历史建筑破败较严重，如图 2 所示。

（2）维修技术复杂、费用高，专业技术人员紧缺。中华巴洛克风格的建筑装饰较为复杂，修复过程耗时长、投资大。同时，古建筑维护修缮是一项复杂的系统工程，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

需要由专业人员实施，否则难以真正实现修旧如旧的改造目标。



图 2　破败较严重的原有建筑

（3）改造任务艰巨。一方面，相关部门对三期改造项目提出了高要求，将三期改造项目总体定位为打造“中华巴洛克艺术殿堂”，包含建筑艺术博物馆、传统艺术展示区、当代艺术融创地三大模块。据初步统计，全域范围内文物建筑共 107 处、历史风貌建筑共 120 处；对现存知名保护建筑深入挖掘整理，共计整理 28 处保护建筑（见图 3）。另一方面，三期改造项目的目标是激发文化街区的后发优势，将街区打造为“哈尔滨新综合核心”“道外区的新消费核心”“年轻人沉浸式生活的新休闲核心”。因此，在进行三期项目改造时，相关部门要求从规划设计、工程建造到投入运营等各个环节，均需要实现突围与破局，在传统业态的基础上，进行现代业态的融合创新，增加街区的人气，实现产业的蓬勃发展，将中华巴洛克街区打造成独具特色的历史街区。

4　中华巴洛克历史文化街区三期项目建筑空间网络与文化空间网络的融合

4.1　建筑空间网络的搭建

对三期改造项目中不可移动的文物建筑、历史风貌建筑等空间进行重构后得到由路网、院落及建筑组成的建筑空间网络[3]，如图 4 所示。

4.2　文化空间网络的搭建

曾经享誉东北的大罗新商场、同记商场、松光电影院等都留在了老哈尔滨人的记忆深处。中华巴洛克文化街区作为道外传统商市历史文化街区，其精美的建筑符号、特有的原生文化、老字号印记中蕴含的丰富的历史信息、原汁原味的传统小吃，以及传统技艺引领的市井商业文化等[4]，构成了三期项目的文化空间网络（见图 4）。

4.3　多重空间的融合及路径

中华巴洛克历史街区是哈尔滨城市历史发展的印记，不仅承载着特定历史时期的社会风俗和生活方式，还体现了人们的价值观与审美观。规划区域内不可移动的文物建筑属于历史文化街区的物质网络，承载着中华巴洛克历史街区的文化价值。例如，中华巴洛克历史街区的四合院反映了人房一体的商业特征，既是联系建筑空间与文化空间的纽带，也是多空间融合的主要表现形式。当人房共存的原生关系被割裂后，中华巴洛克原有的文化氛围就消失了。本文构建以人为核心的建筑与文化网络空间的融合贯通路径（见图 4），主要包括：

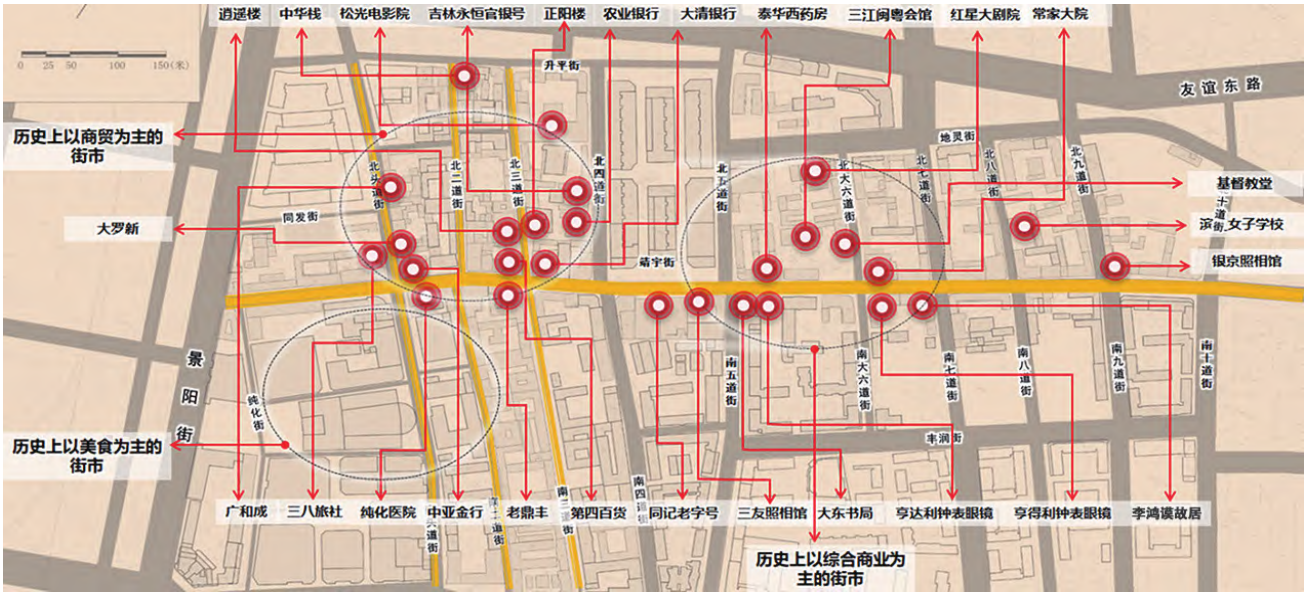


图 3　全域范围内文物建筑

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net




图 4　建筑网络空间与文化网络空间的融合模式

（1）彰显城源文化，聚焦老道外的地域情感。中华巴洛克历史文化街区曾是哈尔滨大量的商家与劳动力聚集地。人流与物流的聚集为其商业经济的发展带来了巨大的机遇，成就了老道外商业的发展。在三期项目改造过程中，相关部门要关注能留住老味道、老风俗的物质层面，实施“修旧如旧”“以旧修旧”“以新补新”等历史街区保护、改造、开发工程。[5]

（2）在传统院落空间打造休闲生活新模式。对院落进行装扮，激发院落的活力，动态、有情怀地展现传统文化技艺，增加互动，传递友爱，吸引游客停留。

（3）充分利用“鱼骨式”路网结构的优势，使各个街区有机衔接。梳理积淀丰厚的民俗文化，并挖掘多个热点、小微区域；以点带面，串联历史文化资源，增加历史文化体验的延续性和促进其多元化。

（4）以后发优势，打造面向青年群体的沉浸式生活休闲核心地。青年群体是最为重要的消费力量，在三期项目改造过程中，为了吸引青年群体，设计人员应在院落空间中营造时尚感与新鲜感；引入能够吸引青年群体的多元文化形式，如动漫、情景剧、探险等；引入有历史渊源的美食，开发符合青年群体节奏、具有时代感的新吃法。

（5）提升原居民的社会融合度、推动原生文化的发展。[6] 延续城市文脉，公众参与也至关重要。三期改造投资要想获得持久的社会效益和经济效益，最有效的途径是将原居民的生活方式深度融入历史文化街区中。

5　中华巴洛克历史文化街区三期项目高质量建造的实施策略

5.1　设计建造一体化，实现工期与成本的最优化

三期改造项目的人文、经济环境与前期改造项目相比，约束条件多、政策要求严，如生态保护、信息化、智能建造、低碳经济、全过程管理等都要融入三期改造项目中。改造工程复杂性的增加，往往带来改造成本增加、工期延长。对于适合“设计建造一体化”的改造项目，相关部门应积极推进工程总承包模式。综合实力强大的工程总承包商不仅能够自行进行设计与施工环节的无障碍沟通，完成项目可实施性论证，确定最优的实施方案（见图 5），而且能够降低项目总成本、缩短项目总工期。



图 5　工程总承包商搭建数字孪生平台展示设计效果图

5.2　积极推广绿色建造、节能与低碳技术

三期项目中原有建筑物局限于当时的用途、建造条件和技术，内部空间布局已难以满足当下的需求。为了便于改建后使用，相关单位须增加建筑结构的跨度，重新规划空间，并且将符合国家绿色建造、低碳、环保等要求的材料和建造技术应用于三期项目中，如钢结构、装配式构件等。这样做能够在满足修复老建筑的同时，增加建筑空间的灵活性，有利于改造后开展多样化的经营活动、延长老建筑的使用周期。

5.3　打造信息化与智能建造平台，提高建造质量与效率

在三期项目改造过程中，历史文化街区范围内的项目

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

数量、项目类型、建造技术、工程规模、破损程度等差异较大，建造者、管理者、监督者工作任务繁重，责任大。三期项目智慧工地管理平台的搭建能够实现对施工现场实时监督（见图6），在施工之前及时发现设计错误，减少工程变更。



图6　巴洛克三期项目智慧工地管理平台

5.4 树立风险意识，实现项目管理综合效益

三期项目改造采用了政府指导、企业实施的模式。多个对立统一关系贯穿三期改造的规划、设计、施工、运营等全过程。如建设企业的经济效益和公共利益的关系、历史文物保护与开发经营的关系、现代商业激发与街区的可持续发展的关系等。树立风险意识、实施风险管理，能够有效促进三期改造工程顺利完成，实现各方共赢。

6 结语

中华巴洛克历史文化街区承载着哈尔滨的城市发展历史。三期改造要注重传统历史文化传承与延续。相关单位应针对中华巴洛克历史文化街区三期改造的目标和难点，构建多空间的融合建设思路及实践路径，将被割裂的原生关系进行连接，在精准修复历史建筑的同时借助现代建造技术和管理手段，实现历史建筑的可持续发展。同时，注入创新思想、与时代相融合打造中华巴洛克文化街区的多元文化，实现老街区焕发活力、带动地域经济新增长的目标。

参考文献：

[1] 金昶余，邵韦平．北京市老旧住区更新技术策略研究——以北京市西城区南礼士路62号院为例[J]. 城市建筑，2023,20(10):76-78.

[2] 蔡籽烩，陆明．原住民社会融合视角的历史街区活化复兴规划研究——以哈尔滨老道外街区为例[J]. 中国名城，2018(3):83-90.

[3] 李俊忠，李建诗，李女仙．广府传统建筑装饰符号在历史街区设计的应用——以广州永庆坊为例[J]. 中国包装，2023,43(5):101-103.

[4] 丁晨，刘晨宇．基于SNA的历史文化街区文化空间网络构建[J]. 建筑与文化，2023(5):140-142.

[5] 王旭，王婧．城市更新塑造生活容器——沈阳大东路历史文化街区景观改造[J]. 风景园林，2023,30(6):82-86.

[6] 蔡萌，侯洁静．基于文化重塑的青岛台东历史商业街区更新策略[J]. 城市建筑，2023,20(10):46-49.

作者简介：

高犁难，男，1970年生，高级工程师，硕士，研究方向：绿色建造及项目管理。

（作者单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net
